

FASE I (incl. park)
Bouwrijp maken
Verkoop
Bouw
Oplevering

85 woningen
januari 2005 *)
juli 2005
oktober 2006
september 2007

FASE II
Sloop
Verkoop
Bouwrijp maken
Bouw
Oplevering

85 woningen
oktober 2005
maart 2006
april 2006
augustus 2007
juni 2008

FASE III
Verkoop
Sloop
Bouwrijp maken
Bouw
Oplevering

40 woningen
oktober 2006
januari 2007
februari 2007
maart 2008
mei 2009

FASE IV
Verkoop
Bouwrijp maken
Bouw
Oplevering

71 woningen
januari 2007
mei 2007
juni 2008
mei 2009

FASE V
Sloop
Bouwrijp maken
Verkoop
Bouw
Oplevering

219 woningen
januari 2007
maart 2007
p.m.
juni 2008
juni 2010

FASE VI (incl. singel)
Saneren
Verkoop
Bouw
Oplevering

61 woningen
juni 2008
juni 2008
december 2009
december 2010

FASE VII
Bouw
Oplevering

overklulzing
augustus 2008
januari 2009
januari 2011

FASE VIII
Bouw


162 woningen
januari 2011
juni 2012

FASE VIII
Bouw

37 woningen
2011

*) startdatum

Aantal woningen
760
Commerciële voorzieningen 5500m²

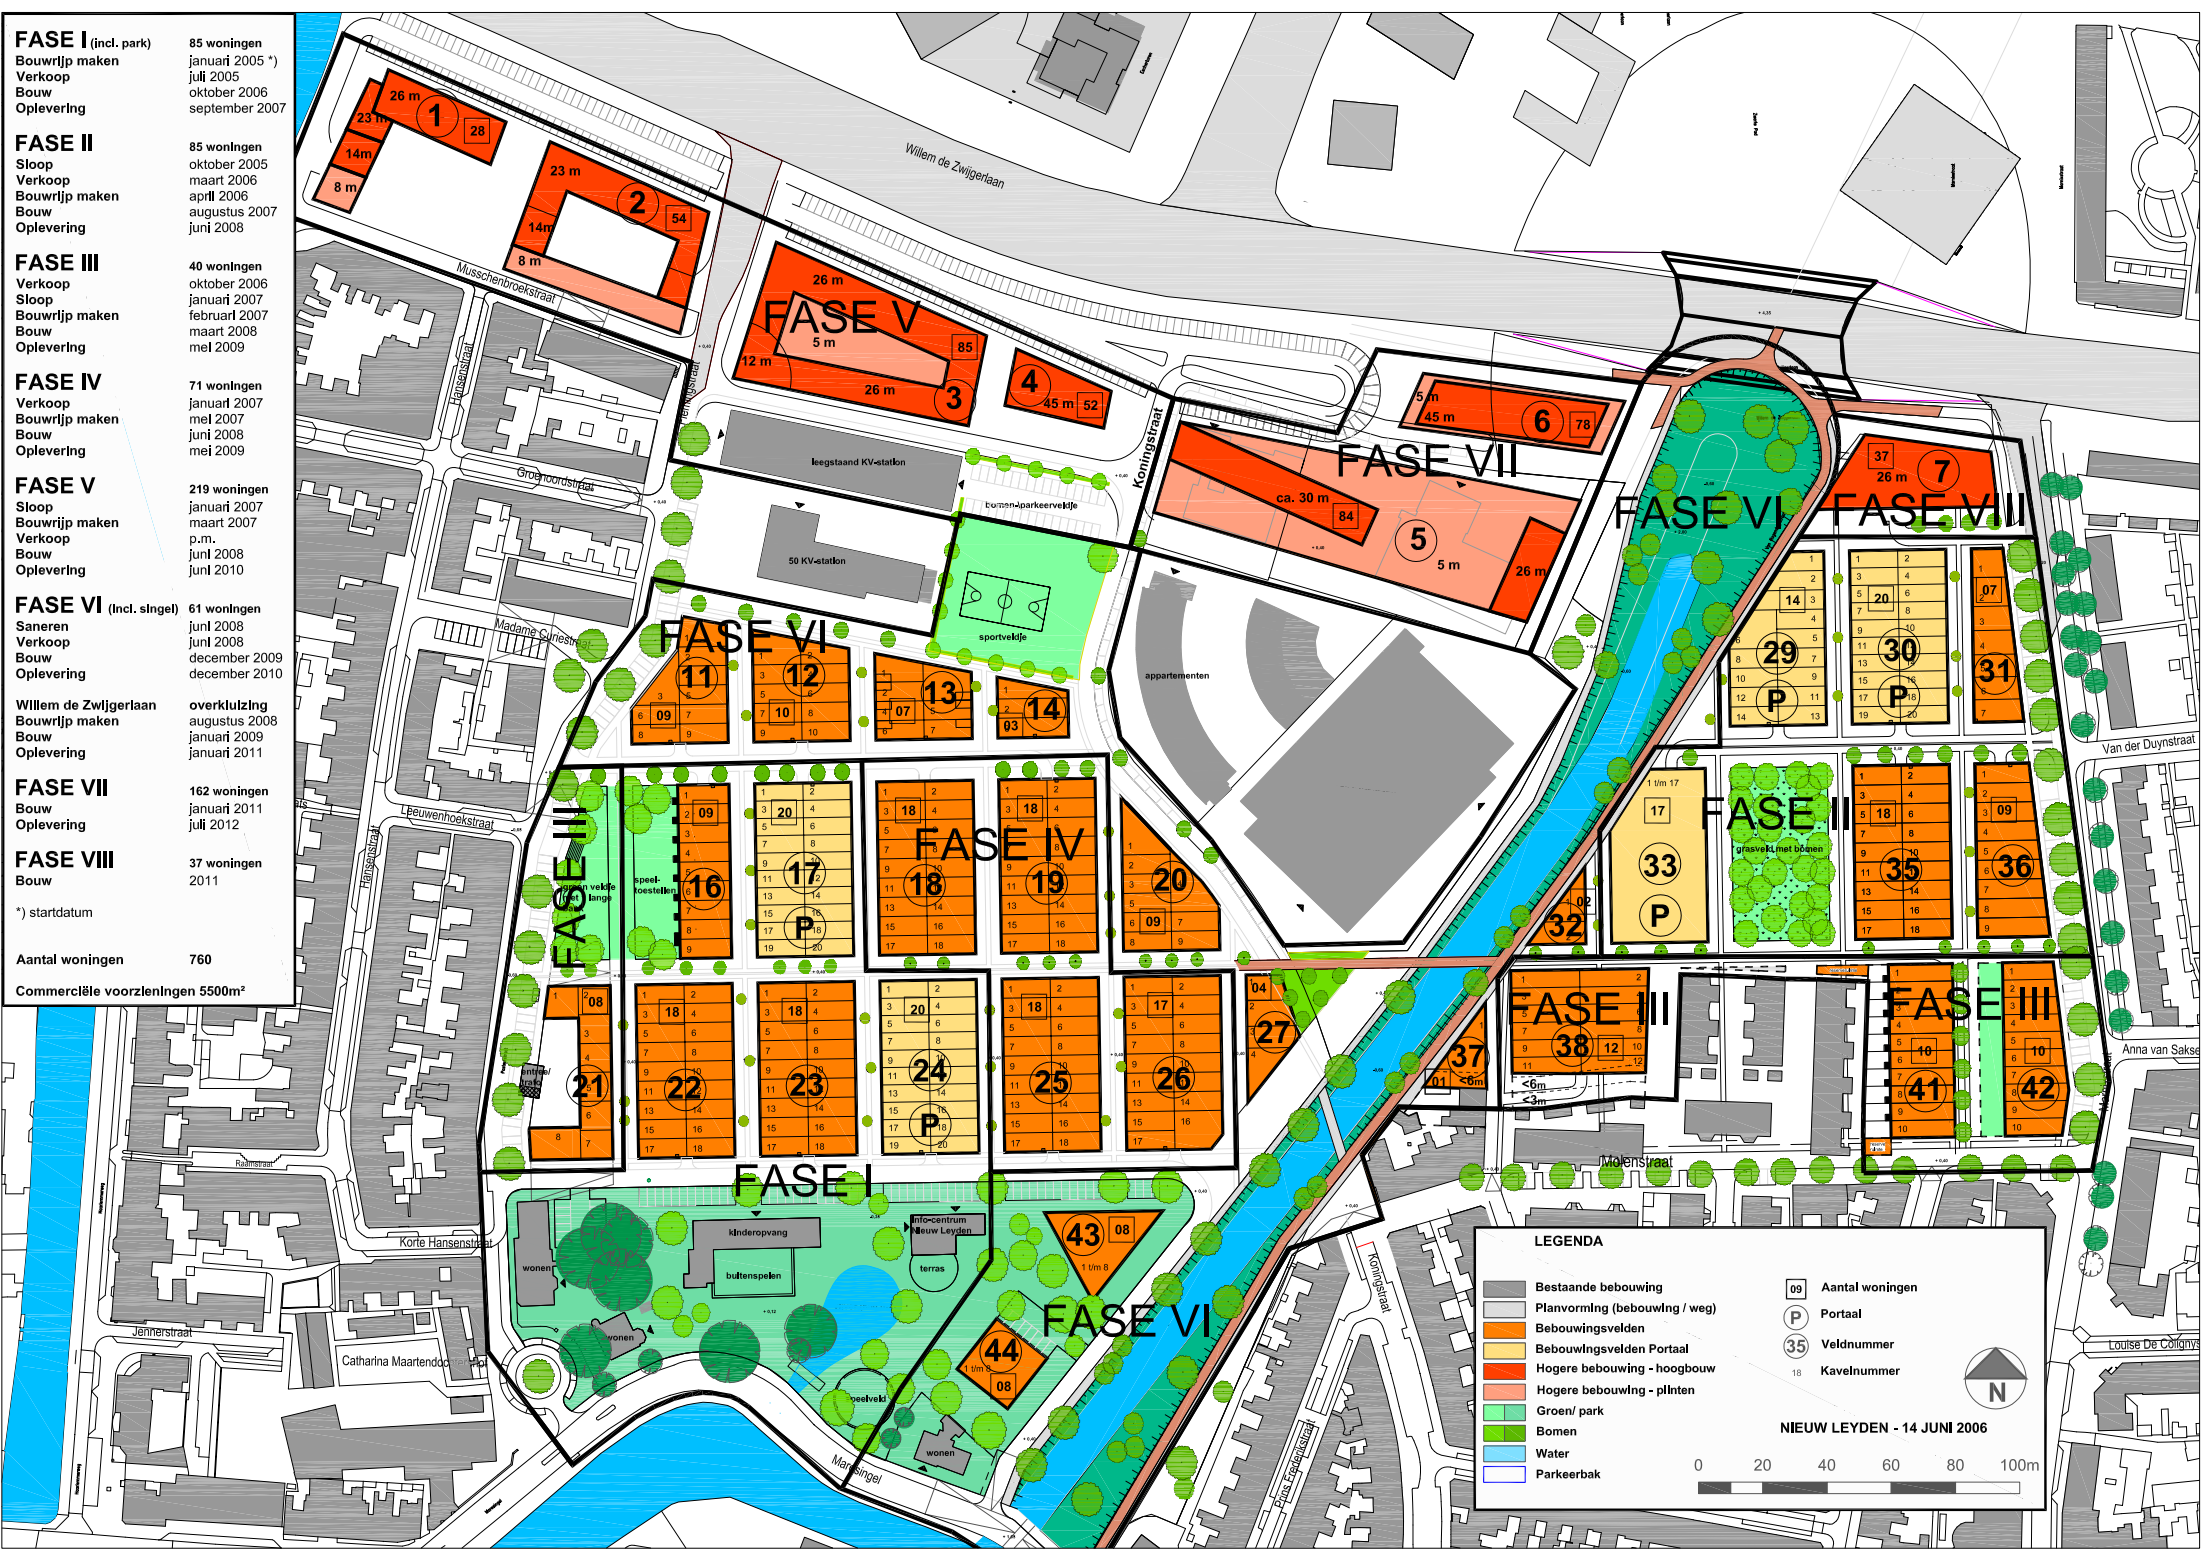

LEGENDA

Bestaande bebouwing	Aantal woningen
Planvorming (bebouwing / weg)	Portaal
Bebouwingsvelden	Veldnummer
Bebouwingsvelden Portaal	Kavelnummer
Hogere bebouwing - hoogbouw	
Hogere bebouwing - plinten	
Groen/ park	
Bomen	
Water	
Parkeerbak	

N
NIEUW LEYDEN - 14 JUNI 2006
0 20 40 60 80 100m
